


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

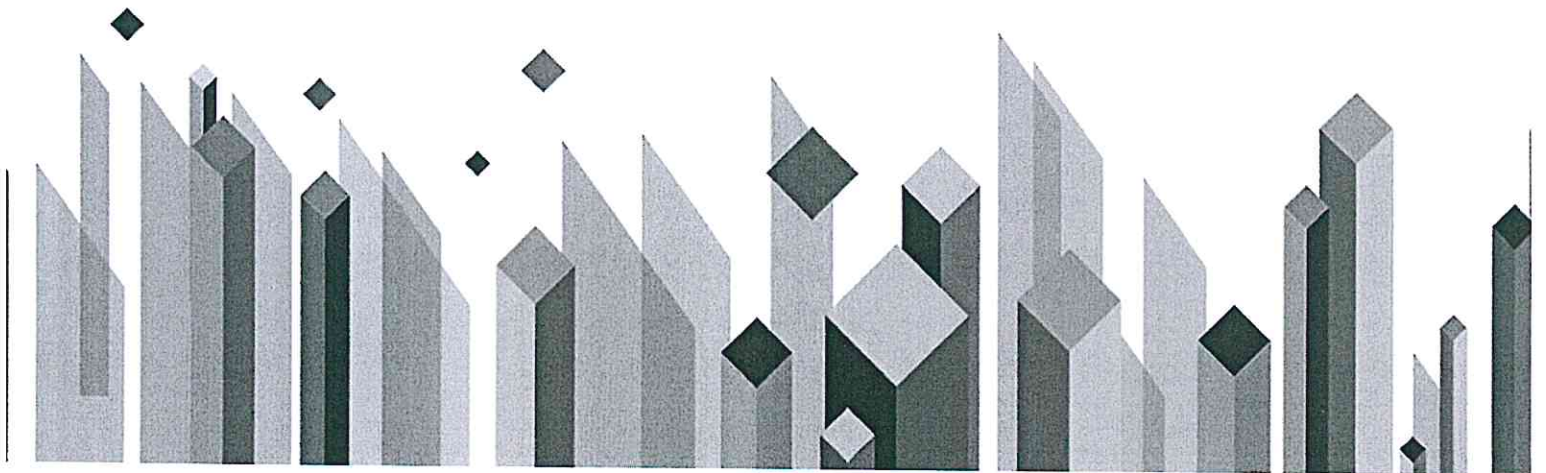

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | I M P O R T E | | | | A V A N C E | | M E T A S R E A L E S | | | | ORÍGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------|---------|-----------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|------------------------|
| | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FÍSICO | % FINANC. | FÍSICAS | | POB. BENEF. | | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U. MED. | CANT. | U. MED. | | | |
| | 613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | | | | | | | | | | | | | |
| | 61311 INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | |
| 61311-001 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE AV. FILIPINAS "B" A AV. HAITI DE CALLE 22 A CALLE 24 | 846,000.00 | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 0% | 0% | 980 | ML | 50 | PERSONAS | FAISM | | |
| 61311-002 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALZADA MONTERREY A CALLE D CALLE 7 A CALLE 11 | 1,731,384.75 | - | - | - | 0% | 0% | 700 | ML | 150 | PERSONAS | FAISM | | |
| | SUB-TOTAL | \$ 2,577,384.75 | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00 | | | | | | | | | |
| | 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| | 61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 61403-003 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 38 | 2,650,000.00 | - | - | - | 0% | 0% | 9,072 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | | |
| 61403-004 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LEANDRO VALLE DE CALLE 2 A CALLE 7 | 2,650,000.00 | - | - | - | 0% | 0% | 7,514 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | | |
| 61403-027 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34 | - | 1,700,000.00 | 1,558,082.83 | 141,917.17 | 100% | 92% | 5,758 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA | |
| 61403-028 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. JAZMIN DE CALLE 2 A CALLE 7 | - | 2,750,000.00 | - | 2,750,000.00 | 0% | 0% | 7,514 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | | |
| | SUB-TOTAL | \$ 5,300,000.00 | \$ 4,450,000.00 | \$ 1,558,082.83 | \$ 2,891,917.17 | | | | | | | | | |
| | 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| 61408-005 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, POR LA AV. LEANDRO VALLE B | 3,000,000.00 | 2,700,000.00 | 2,149,921.11 | 550,078.89 | 96% | 80% | 1,500 | ML | 17,280 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA | |
| 61408-006 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO ISLITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. | 4,150,000.00 | 6,700,000.00 | 1,947,648.91 | 4,752,351.09 | 50% | 29% | 1 | PZA | 6,200 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PUBLICA | |
| 61408-007 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LAGUNITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. | 4,150,000.00 | 6,800,000.00 | 1,916,277.23 | 4,883,722.77 | 50% | 28% | 1 | PZA | 5,250 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PUBLICA | |
| 61408-029 | AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COLONIA MEZQUITE | | 2,537,021.62 | - | 2,537,021.62 | 0% | 0% | 3,500 | ML | 10,000 | PERSONAS | FAISM | | |
| | SUB-TOTAL | \$ 11,300,000.00 | \$ 18,737,021.62 | \$ 6,013,847.25 | \$ 12,723,174.37 | | | | | | | | | |
| | 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública

DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | I M P O R T E | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORÍGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
| | | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FÍSICO | % FINANC. | FÍSICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U. MED. | CANT. | U. MED. | | |
| 61409-008 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, KINO Y CALLE 7 AV. 5 DE MAYO Y CALLE 7 AV. TAMAULIPAS Y CALLE 22 AV. CAPITAN CARLOS G. CALLES Y CALLE 16 AV. REVOLUCION Y CALLE 11 AV. LIBERTAD Y CALLE 28 AV. COLIMA Y CALLE 30 CALLEJON CARRANZA Y CALLE 17 AV. TLAXCALA Y CALLE 9 AV. 16 DE SEPT Y CALLE 2 AV. SINALOA Y CALLE 2 CALLEJON CHIHUAHUA Y CALLE 24 AV. NVO LEON Y CALLE 22 AV. REVOLUCION Y CALLE 24 AV. SONORA Y CALLE 7 AV. CARRANZA Y CALLE 7 AV. QUINTANA ROO Y CALLE 12 JAZMIN Y CALLE 12 AV. ALVARO OBREGON Y 48 AV. | 2,630,000.00 | 2,585,578.38 | 2,585,576.37 | 0.01 | 100% | 100% | 27 | PZAS | 193,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 61409-009 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, TERCERA ETAPA | 1,700,000.00 | - | - | - | 0% | 0% | 1,200 | ML | 5,790 | PERSONAS | FAISM | |
| 61409-010 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO NUEVO MICHOCACAN | 2,100,000.00 | 2,200,000.00 | - | 2,200,000.00 | 0% | 0% | 1,270 | ML | 5,250 | PERSONAS | FAISM | |
| 61409-011 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA REFORMA | 4,275,000.00 | - | - | - | 0% | 0% | 1 | OBRA | 10,000 | PERSONAS | FAISM | |
| | SUB-TOTAL | \$ 10,705,000.00 | \$ 4,785,576.38 | \$ 2,585,576.37 | \$ 2,200,000.01 | | | | | | | | |
| 61416 | CECOP | | | | | | | | | | | | |
| 61416-020 | CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA JUAN CABRAL | - | 491,125.57 | 491,125.57 | - | 100% | 100% | 315 | M2 | 450 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-021 | CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA | - | 284,966.15 | 284,966.17 | - | 100% | 100% | 215 | M2 | 500 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-022 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS SONORA | - | 451,958.40 | 451,958.40 | - | 100% | 100% | 220 | M2 | 300 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-023 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTACIONAMIENTO EN CECATI 124 | - | 792,377.42 | 855,767.62 | - | 100% | 100% | 618 | M2 | 350 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-024 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO | - | 75,148.62 | 75,148.62 | - | 100% | 100% | 198 | M2 | 300 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-025 | CONSTRUCCION DE FIRME Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JOHNSON | - | 348,131.82 | 348,131.82 | - | 100% | 100% | 48 | M2 | 300 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| 61416-030 | REHABILITACION DE MALLASOMBRA Y ACABADOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C. A. M. 80 | - | 115,755.88 | - | 115,755.88 | 0% | 0% | 169 | M2 | 250 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | |
| 61416-031 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2 | - | 207,043.76 | 191,974.32 | 15,069.44 | 100% | 100% | 310 | M2 | 300 | PERSONAS | CECOP-RPEM-BENEF | ADJUDICACION DIRECTA |
| | SUB-TOTAL | \$ - | \$ 2,766,507.62 | \$ 2,699,072.52 | \$ 67,435.10 | | | | | | | | |
| 61422 | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | | | | | | | | | | | | |

**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Publica
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | I M P O R T E | | | | AVANCE | | METAS REALES | | | | ORÍGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
| | | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO | POR DEVENGAR | % FÍSICO | % FINANC. | FÍSICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANT. | U. MED. | CANT. | U. MED. | | |
| 61422-012 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 8 DE AV. ARGENTINA A AV. DOMINICA | 7,650,000.00 | 6,350,000.00 | 2,297,458.72 | 4,052,541.28 | 70% | 36% | 6,133 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PUBLICA |
| 61422-013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 DE AV. KINO A AV. REVOLUCION | 7,500,000.00 | - | - | - | 0% | 0% | 7,400 | M2 | 100,000 | PERSONAS | FAISM | |
| 61422-014 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30 | 5,600,000.00 | 6,900,000.00 | 3,277,654.36 | 3,622,345.64 | 95% | 48% | 9,627 | M2 | 10,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION PUBLICA |
| 61422-026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TLAXCALA DE CALLE 29 A CALLE 30 | - | 1,203,782.07 | 1,203,782.07 | - | 100% | 100% | 1,770 | M2 | 10,000 | PERSONAS | RPEM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| | SUB-TOTAL | \$ 20,750,000.00 | \$ 14,453,782.07 | \$ 6,778,895.15 | \$ 7,674,886.92 | | | | | | | | |
| 622 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 62201 | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 62201-032 | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PANTEON MUNICIPAL 2 | - | 660,000.00 | 314,612.91 | 345,387.09 | 70% | 48% | 38.50 | M2 | 50,000 | PERSONAS | RPEM | ADJUDICACION DIRECTA |
| | SUB-TOTAL | \$ - | \$ 660,000.00 | \$ 314,612.91 | \$ 345,387.09 | | | | | | | | |
| 624 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 62422 | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 62422-015 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 1 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | 1,863,717.23 | - 177,717.23 | 100% | 111% | 212 | PZA | 3,000 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-016 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO, ETAPA 2 | 854,000.00 | 854,000.00 | 731,832.19 | 122,167.81 | 100% | 86% | 104 | PZA | 1,500 | PERSONAS | FAISM | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62422-017 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO RIO COLORADO, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ | 1,535,000.00 | 1,535,000.00 | - | 1,535,000.00 | 0% | 0% | 44 | PZA | 3,000 | PERSONAS | FAISM | |
| 62422-018 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLAFLORENDA, EN EL POBLADO LUIS B. SANCHEZ | 1,762,000.00 | 1,762,000.00 | - | 1,762,000.00 | 0% | 0% | 62 | PZA | 1,000 | PERSONAS | FAISM | |
| 62422-019 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A. CAMELIAS "B" A AV. FLORES "B" DE CALLE 42 A CALLE 48 | 1,174,376.00 | 1,174,376.00 | - | 1,174,376.00 | 0% | 0% | 36 | PZA | 1,000 | PERSONAS | FAISM | |
| | SUB-TOTAL | \$ 7,011,376.00 | \$ 7,011,376.00 | \$ 2,595,549.42 | \$ 4,415,826.58 | | | | | | | | |
| | TOTALES | \$ 57,643,760.75 | \$ 54,064,263.69 | \$ 22,545,636.45 | \$ 31,518,627.24 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Santos Gonzalez Yescas
Secretario Municipal
San Luis Río Colorado, Sonora


C.P. Sergio Tapia Salcedo
Secretario de Finanzas

San Luis Río Colorado, Sonora


Ing. Luis Lara Cárdenas
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO
